

 Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiệu quả Bộ phận soạn thảo Điều phối dự án	QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN	Ngày thiết lập (sửa đổi)	26.11.2024
		Mã số tài liệu	EB-HC-029
		Phiên bản 1	Trang 1/4

Phê duyệt phát hành	Thiết lập	
 Lê Chí Tài 17/03/2025	 Hồ Thị Thanh Hiền 26/11/2024	

1. Mục đích:

- Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận nội bộ (kỹ thuật, hành chính nhân sự, kế toán,...) và khách hàng, chủ đầu tư, nhà cung cấp trong công tác vận hành và bảo trì.
- Duy trì luồng thông tin xuyên suốt, chính xác và kịp thời giữa các phòng ban trong công ty và các bên liên quan.

2. Phạm vi công việc:

Quy trình này được áp dụng cho các công việc liên quan đến:

- Giao tiếp và quản lý thông tin: Với khách hàng, chủ đầu tư và các phòng ban nội bộ.
- Điều phối nội bộ: Lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ và kiểm soát tiến độ.
- Quản lý công việc hàng ngày: Giám sát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện công việc.

3. Nội dung:

1. Quy trình quản lý công việc đầu ngày

Người thực hiện: Điều phối dự án

Hoạt động:


- Kiểm tra công việc đầu ngày
 - Xem xét danh sách công việc xử lý đầu ngày
 - Kiểm tra email/ tin nhắn từ group chat Zalo từ các phòng ban, khách hàng, chủ đầu tư.
- Điều phối và hỗ trợ
 - Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc cần giải quyết.
 - Phối hợp với các nhóm để xử lý vấn đề phát sinh hoặc hỗ trợ các phòng ban khi cần.

 Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiệu quả Bộ phận soạn thảo Điều phối dự án	QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN	Ngày thiết lập (sửa đổi)	26.11.2024
		Mã số tài liệu	EB-HC-029
		Phiên bản 1	Trang 2/4
• Tương tác với khách hàng - Phản hồi tin nhắn và trả lời email cho khách hàng/chủ đầu tư về các vấn đề cần giải quyết. - Ghi nhận các yêu cầu mới và đưa vào kế hoạch. • Tổng kết cuối ngày - Ghi chú tiến độ công việc, các vấn đề đã xử lý, những công việc còn tồn đọng để nhắc nhở và theo dõi. 2. Quy trình giao tiếp và quản lý thông tin: Người thực hiện: Điều phối dự án Hoạt động: • Nhận thông tin: - Tiếp nhận thông tin từ khách hàng/chủ đầu tư hoặc các phòng ban nội bộ qua email, group Zalo, cuộc họp hoặc trao đổi trực tiếp. • Xử lý và phân phối thông tin: - Phân loại thông tin: Ưu tiên theo mức độ khẩn cấp và quan trọng. - Chuyển thông tin cho các bộ phận liên quan (phòng kỹ thuật, hành chính, tài chính, marketing, v.v.) • Theo dõi phản hồi: - Đảm bảo các yêu cầu được xử lý đúng hạn và phản hồi lại khách hàng/chủ đầu tư. - Thông báo tiến độ và kết quả cho khách hàng/chủ đầu tư. • Lưu trữ thông tin: - Lưu trữ tài liệu trao đổi, đầu vào trên hệ thống sharepoint/máy tính. 3. Quy trình điều phối công việc nội bộ Người thực hiện: Điều phối dự án Hoạt động: • Lên kế hoạch - Xây dựng kế hoạch danh sách công việc ưu tiên trong tuần, trong tháng theo các tiêu chí: thời gian, mức độ quan trọng, mức độ ảnh hưởng đến công ty,...			

 electric bird Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiệu quả Bộ phận soạn thảo Điều phối dự án	QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN	Ngày thiết lập (sửa đổi)	26.11.2024
		Mã số tài liệu	EB-HC-029
		Phiên bản 1	Trang 3/4

- Hợp định kỳ kỹ thuật, hành chính để cập nhật và theo dõi tiến độ công việc.
- Phân công nhiệm vụ
- Xác định nhân sự và thời gian hoàn thành cho từng hạng mục công việc.
- Kiểm soát tiến độ
- Theo dõi các báo cáo hàng ngày để nắm kế hoạch công việc chung.
- Nhắc nhở tiến độ, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh khi cần thiết.
- Nhắc nhở tiến độ tùy theo từng đầu mục công việc sẽ có khung thời gian nhắc nhở khác nhau
- Đánh giá
- Báo cáo kết quả Công việc cho Ban Giám đốc.
- Ghi nhận ý kiến phản hồi, đóng góp của các nhân sự liên quan để cải tiến quy trình.

4. Lưu đồ quy trình Điều phối dự án

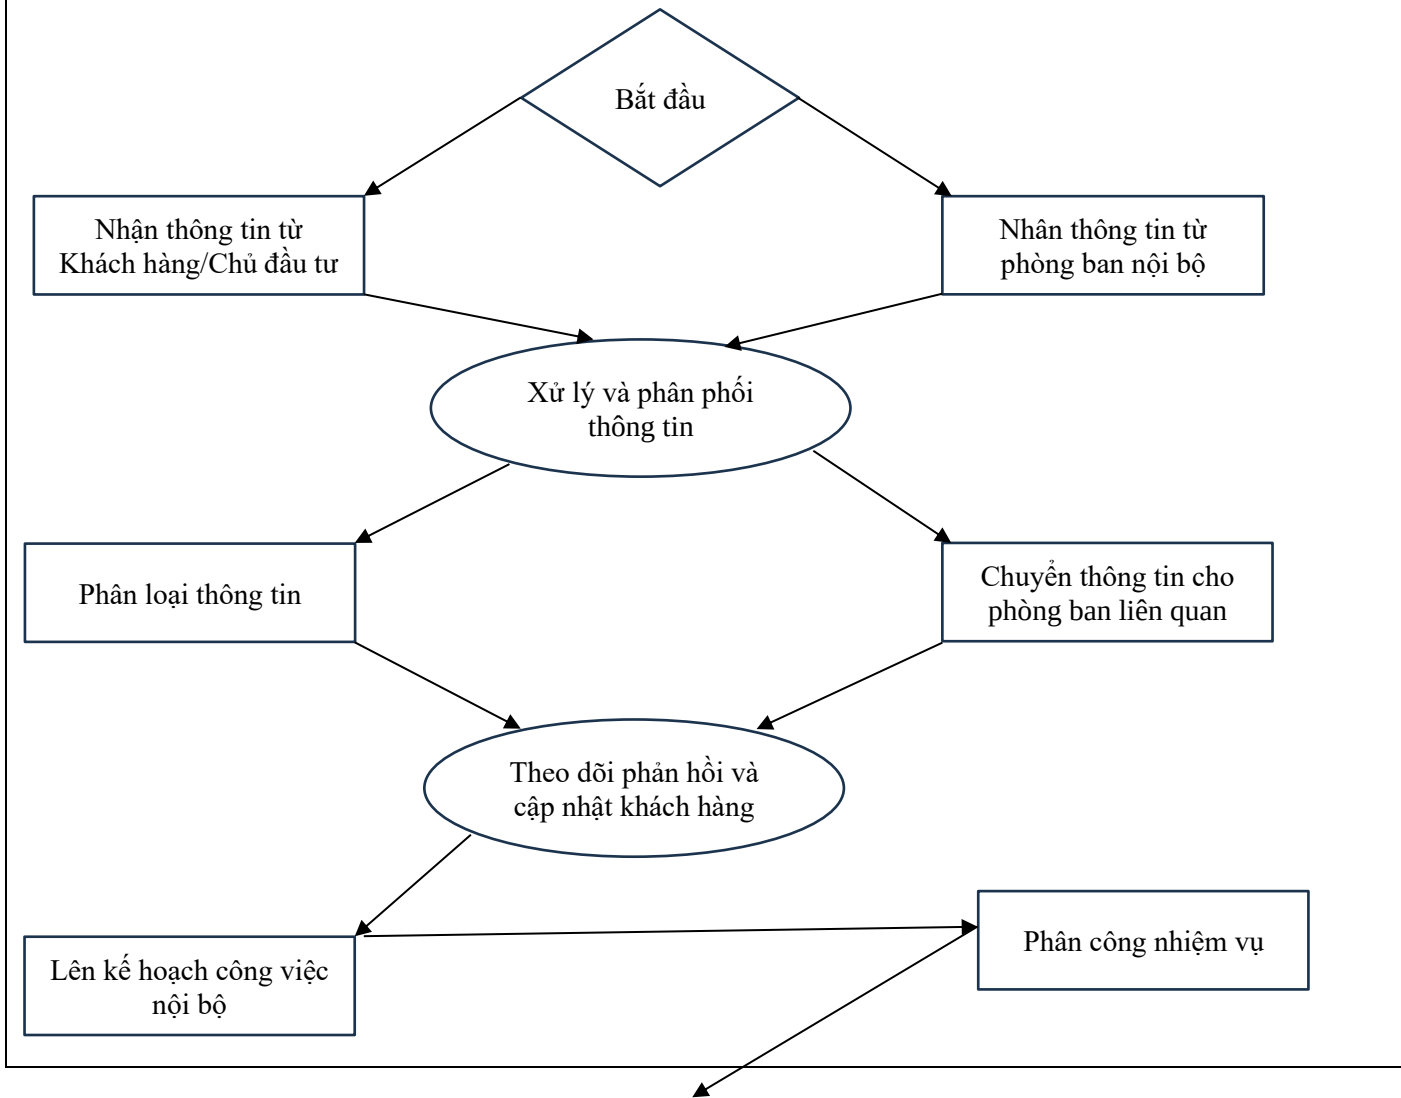

 Uy tín - Chuyên nghiệp - Hiệu quả Bộ phận soạn thảo Điều phối dự án	QUY TRÌNH ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN	Ngày thiết lập (sửa đổi)	26.11.2024
		Mã số tài liệu	EB-HC-029
		Phiên bản 1	Trang 4/4

